INFORME SCRUM

Primera entrega (30/09-21/10)

Asignatura	Análisis y Diseño de Aplicaciones
Equipo / Grupo	Elefantitos, grupo A

1. Identificación del equipo

Nombre y apellidos	Rol
Tania Muñoz Iglesia	**Scrum Master**
Fernando de la Cruz Martos	Desarrollador
Lucas Ariel Fanelli Sánchez	Desarrollador
Lucas Grande Ramírez	Desarrollador
Julio Herrera Sánchez	Desarrollador
Alexandru Olsanschi	Desarrollador
Antonio Rengel Fernández	Desarrollador
Rubén Sánchez Rosa	Desarrollador

2. Organización del trabajo

Pusimos en común todo lo que cada integrante había apuntado durante la reunión con el cliente, recopilando de forma superficial los requisitos en un primer documento en sucio que también nos servirá en el futuro para incluir notas y especificaciones entre los miembros del grupo. Participamos todos los integrantes, que posteriormente dividimos las tareas para facilitar el análisis de las transcripciones y complementar la información inicial.

Para el primer sprint, Tania desempeñará el papel de Scrum Master y se encargará de documentar todo lo relacionado con las reuniones y la compleción de las tareas en el informe Scrum, elaborando un plan a futuro para las siguientes sesiones. Un subgrupo de cuatro integrantes (Lucas G., Rubén, Alexandru y Antonio) se repartió los últimos retoques de recopilación y depuración de requisitos, asignando a cada uno una categoría: negocio, usuario, funcionales y no funcionales. Cada integrante se encargará de pasar a limpio los requisitos asignados siguiendo el formato de la plantilla especificada, además de documentar las secciones adicionales del documento (contexto, reglas de negocio, dudas, glosario, etc.). Los tres integrantes restantes (Fernando, Lucas F. y Julio) recopilaron toda la información sobre los casos de uso extraídos de las entrevistas con el cliente y la contrastaron con los requisitos funcionales, con el objetivo de facilitar la especificación y elaboración de las fichas y diagramas en los siguientes sprints.

Para el segundo sprint, Tania sigue documentando todo respecto al informe scrum. Dividimos las tareas restantes de esta entrega (casos de uso) en dos mitades: especificación y esquematización. Unos 4 integrantes (Rubén, Lucas F., Lucas G., Julio) se encargan de revisar el documento en sucio elaborado en el anterior sprint (y de complementarlo con las secciones restantes) y pasarlo a un formato más detallado y formal para su correspondiente entrega. El resto del grupo (Tania, Fernando, Antonio y Alexandru) se han dividido los casos de uso en bloques funcionales (cobros, acceso, suscripciones, etc.) para que cada uno haga los diagramas de su correspondiente parte y después se junten para su entrega.

3. Sprints realizados

Sprint 1

Fecha de inicio	30/09/2026
Fecha de finalización	14/10/2026
Objetivo del Sprint	Identificar, analizar y documentar todos los requisitos posibles. Empezar a elaborar la especificación de algunos casos de uso.
Tareas planificadas	- Lectura de transcripciones y elaboración de documento inicial con los requisitos estudiados (todos los miembros). - Especificaciones más en profundidad de los requisitos y pasarlos al formato plantilla facilitado (4 miembros). - Primer contacto con los casos de uso, recopilando información inicial (3 miembros). - Documentar reuniones en informe (scrum master).
Tareas completadas	Todas las planificadas (en la primera semana se hizo el documento inicial de requisitos, el resto de tareas fueron asignadas para hacer en la segunda semana) salvo algunos puntos extra del documento de requisitos.
Reuniones realizadas	2 reuniones: 30/09 y 07/10
Problemas encontrados	- Dificultad a la hora de categorizar algunos requisitos. - Requisitos inicialmente ambiguos que daban lugar a confusiones o contradicciones. - Manejo del git para control de versiones.
Soluciones aplicadas	- Aclaración entre compañeros e intentar interpretarlos de la mejor manera posible ayudados de la teoría. - Revisión exhaustiva de las transcripciones para depurar lo máximo posible y apuntar aquellos requisitos aún confusos en el apartado de dudas. - El manejo del git sigue pendiente de especificar.

Acta de reunión: 30/09/2026

Fecha	30/09/2026
Modalidad	Presencial (sesión laboratorio)
Duración de la sesión	1:45h
Asistentes	Los ocho miembros del equipo.

Acuerdos alcanzados	Realización de un documento en conjunto con todos los requisitos que podamos sacar de las transcripciones y apuntes de la sesión con el cliente.


Tarea acordada	Responsable asignado	Estado
Realizar borrador muy general del documento de requisitos.	Todos.	Completo.

Acta de reunión: 07/10/2026


Fecha	07/10/2026
Modalidad	Presencial (sesión laboratorio)
Duración de la sesión	1:45h
Asistentes	Los ocho miembros del equipo.
Acuerdos alcanzados	División de tareas en las que cuatro miembros se encargará de transcribir los requisitos recopilados en sucio al formato plantilla y explicando con más detalle todos los matices necesarios, mientras que los demás miembros tienen un primer contacto con los casos de uso derivados de los requisitos.

Tarea acordada	Responsable asignado	Estado
Documento de requisitos.	Rubén, Antonio, Alexandru, Lucas G.	Completo.
Recopilar información útil sobre los CU.	Fernando, Julio, Lucas F.	En proceso.
Realización del informe.	Tania.	En proceso.

Estado del tablero en el Sprint Planning

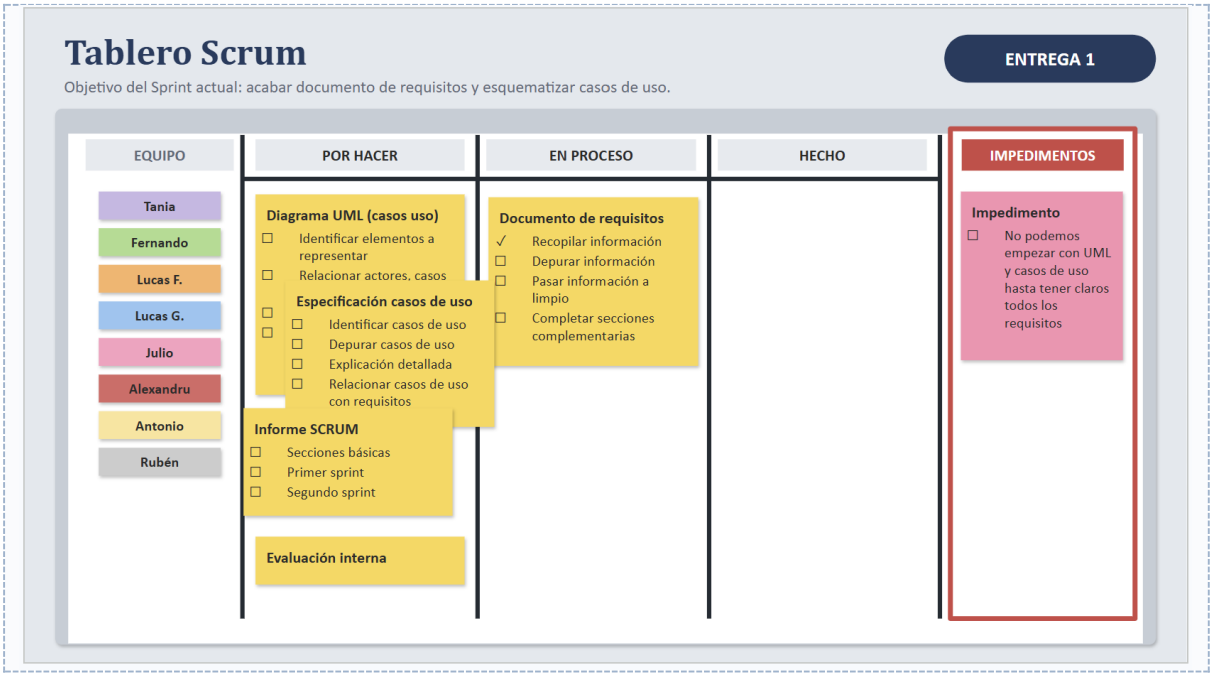

Estado del tablero en la Sprint Retrospective

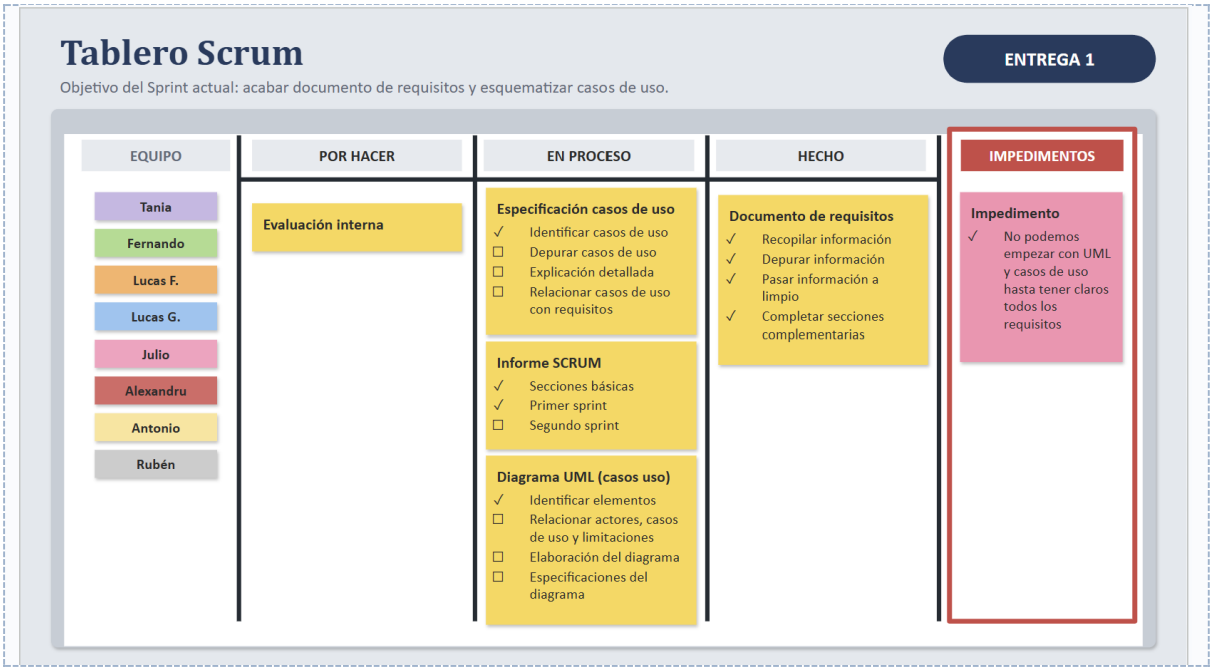

Evidencias auditables del tablero

Herramienta del tablero (Jira / Trello / GitHub Projects)	GitHub
Enlace auditable al tablero	https://github.com/vertosofficial/Elefantes.git
Fecha y hora de las capturas	

Espacio para captura real adicional del tablero (si procede)

Sprint 2

Fecha de inicio	14/10/2026
Fecha de finalización	23/10/2026
Objetivo del Sprint	Escribir de forma más detallada la especificación de casos de uso. Elaborar los diagramas UML correspondientes.
Tareas planificadas	- Terminar las tareas atrasadas del anterior sprint. - Elaborar el documento de especificación de casos de uso con todos los puntos correspondientes. (4 miembros). - Crear diagrama UML de todos los casos de uso especificados (4 miembros). - Seguir documentando reuniones (scrum master).
Tareas completadas	Todas las planificadas, además de la elaboración de diapositivas explicativas para la sesión poster.
Reuniones realizadas	2 reuniones: 14/10 (virtual) y 21/10
Problemas encontrados	- Manejo útil del git. - Duda sobre algunos aspectos hablados por el cliente (superadministrador, darse de alta y de baja, confirmación al cliente, etc.) que incumben a los casos de uso.
Soluciones aplicadas	- Mantenemos control de versiones tanto en una carpeta drive compartida (con la que estamos más familiarizados) como en git para hacer commits y push/pull. - Dudas expuestas en la reunión y debatidas hasta llegar a un consenso entre los miembros del equipo sobre como solucionar cada ambigüedad.

Acta de reunión: 14/10/2026

Fecha	14/10/2026
Modalidad	Virtual
Duración de la sesión	30m
Asistentes	Todos los miembros.

Acuerdos alcanzados	Como no era posible una reunión en clase debido a día no lectivo, decidimos dividir las tareas de la semana de forma telemática.


Tarea acordada	Responsable asignado	Estado
Especificaciones CU.	Julio, Rubén, Lucas G., Lucas F.	En proceso.
Diagramas UML.	Fernando, Alexandru, Antonio, Tania	En proceso.
Realizar informe.	Tania	En proceso.

Acta de reunión: 21/10/2026


Fecha	21/10/2026
Modalidad	Presencial (sesión de laboratorio)
Duración de la sesión	1:45h
Asistentes	Todos los participantes.
Acuerdos alcanzados	Terminar los últimos retoques a todos los documentos que necesitamos entregar y ver qué hacer en la sesión de póster.

Tarea acordada	Responsable asignado	Estado
Terminar tareas asignadas anteriormente.	Todos.	Completado.
Revisión antes de la entrega.	Tania.	Completado.
Realizar informe.	Tania.	Completado.

Estado del tablero en el Sprint Planning

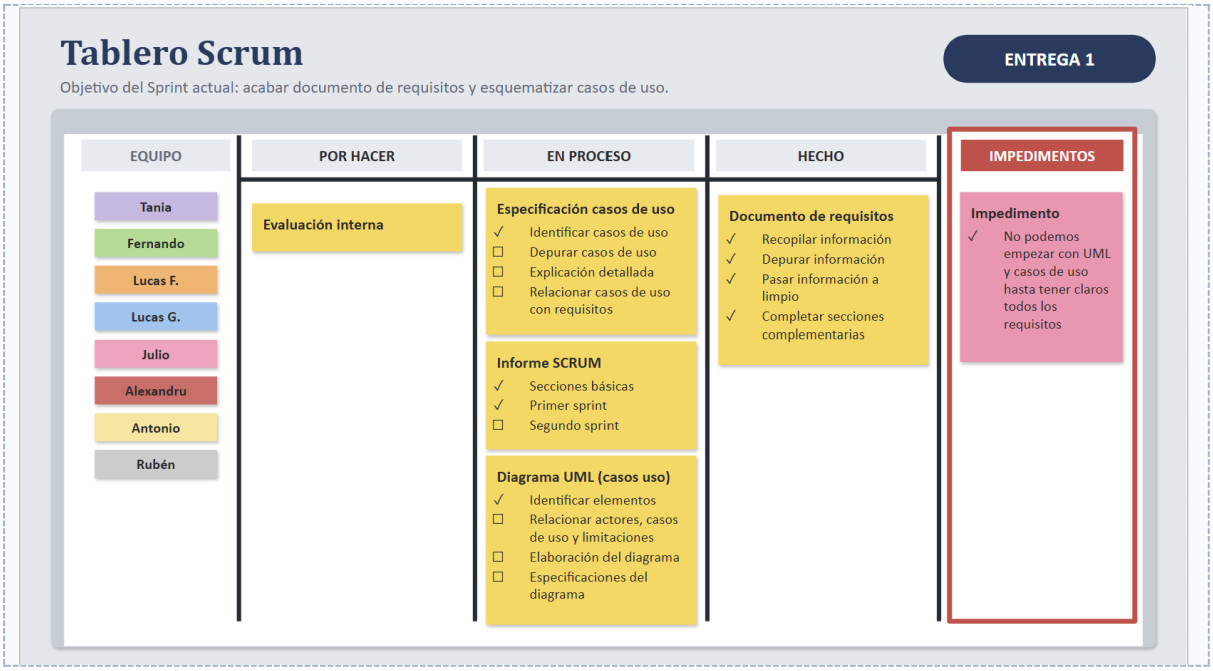

Estado del tablero en la Sprint Retrospective

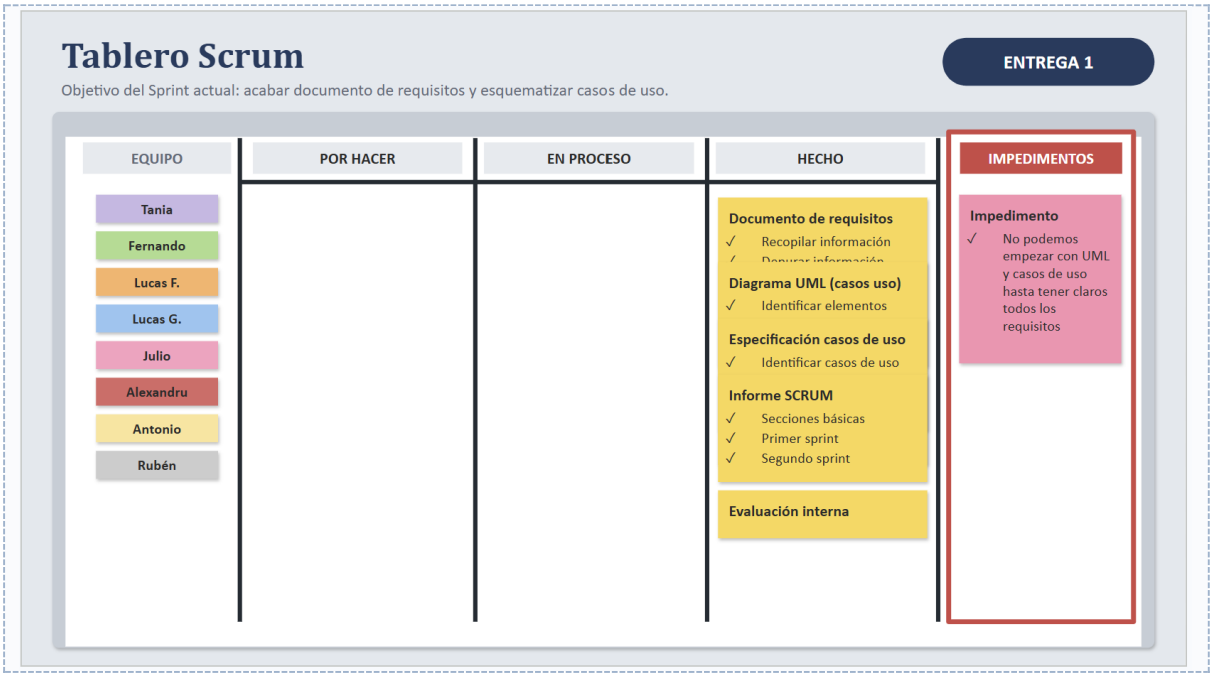

Evidencias auditables del tablero

Herramienta del tablero (Jira / Trello / GitHub Projects)	GitHub
Enlace auditable al tablero	https://github.com/vertosofficial/Elefantes.git
Fecha y hora de las capturas	

Espacio para captura real adicional del tablero (si procede)

4. Validación del cliente y dudas abiertas

Acuerdos del equipo frente a validación del cliente

Tipo: «Validado por Turbine» (respaldado por las entrevistas, indicando RI/RA y página) o «Hipótesis interna» (propuesta de diseño del equipo).

Punto o ambigüedad	Tipo	Fuente (RI/RA, página)	Estado
Superadministrador	Requisitos	RI	Resuelta.
Darse de alta y de baja	Casos de uso	RA	Resuelta.
Confirmación al cliente	Requisitos	RA	Resuelta.

Registro de dudas y preguntas abiertas

Nº	Duda o pregunta	Origen	Responsable de consultarla	Estado / resolución
1				
2				
3				

Nº	Duda o pregunta	Origen	Responsable de consultarla	Estado / resolución
4				

5. Control de calidad en la retrospectiva

Miembro responsable de la revisión	Tania Muñoz Iglesia
Ámbito de la revisión	Coherencia cruzada entre requisitos, fichas de casos de uso y diagramas UML
Momento de la revisión	Antes de iniciar los diagramas de secuencia
Visto bueno para iniciar los diagramas de secuencia (Sí / No)	Sí.
Fecha del visto bueno	17/10

Verificación cruzada	Resultado (Conforme / No conforme)	Incidencias detectadas	Fecha de revisión
Requisitos ↔ fichas de casos de uso	Conforme.	Ninguna.	17/10
Fichas de casos de uso ↔ diagramas UML	Conforme.	Ninguna.	20/10
Requisitos ↔ diagramas UML	Conforme.	Ninguna.	20/10

6. Problemas y riesgos

Todos los problemas encontrados se han ido especificando en las tablas de cada sprint, los problemas aún pendientes se intentarán solucionar lo antes posible en las siguientes entregas para no acarrear errores o complicaciones en implementaciones futuras.

7. Valoración final

Hemos conseguido completar todos los puntos necesarios de esta entrega (requisitos, diagrama UML y casos de uso), por lo cuál estamos satisfechos con el desempeño del grupo y como hemos ido trabajando progresivamente.

La división de tareas ha sido clara a un nivel general, pero a lo mejor deberíamos trabajar en el volumen de tarea individual que tiene cada integrante dentro de las divisiones. Básicamente dividir y especificar aún más dentro de las divisiones hasta llegar a una asignación individual en vez de una general de subgrupo. Esto se ha tenido en cuenta al hacer el tablero con las tareas.

Para los siguientes sprints seguiremos con este modelo de división de tareas semanal para ir trabajando de forma eficiente y no acumular una carga pesada de tareas para los últimos días.
