INFORME SCRUM

Primera entrega (30/09-21/10)

Asignatura	Análisis y Diseño de Aplicaciones
Equipo / Grupo	Elefantitos, grupo A

1. Identificación del equipo

Nombre y apellidos	Rol
Tania Muñoz Iglesia	**Scrum Master**
Fernando de la Cruz Martos	Desarrollador
Lucas Ariel Fanelli Sánchez	Desarrollador
Lucas Grande Ramírez	Desarrollador
Julio Herrera Sánchez	Desarrollador
Alexandru Olsanschi	Desarrollador
Antonio Rengel Fernández	Desarrollador
Rubén Sánchez Rosa	Desarrollador

2. Organización del trabajo

Pusimos en común todo lo que cada integrante había apuntado durante la reunión con el cliente, recopilando de forma superficial los requisitos en un primer documento en sucio que también nos servirá en el futuro para incluir notas y especificaciones entre los miembros del grupo. Participamos todos los integrantes, que posteriormente dividimos las tareas para facilitar el análisis de las transcripciones y complementar la información inicial.

Para el primer sprint, Tania desempeñará el papel de Scrum Master y se encargará de documentar todo lo relacionado con las reuniones y la compleción de las tareas en el informe Scrum, elaborando un plan a futuro para las siguientes sesiones. Un subgrupo de cuatro integrantes (Lucas G., Rubén, Alexandru y Antonio) se repartió los últimos retoques de recopilación y depuración de requisitos, asignando a cada uno una categoría: negocio, usuario, funcionales y no funcionales. Cada integrante se encargará de pasar a limpio los requisitos asignados siguiendo el formato de la plantilla especificada, además de documentar las secciones adicionales del documento (contexto, reglas de negocio, dudas, glosario, etc.). Los tres integrantes restantes (Fernando, Lucas F. y Julio) recopilaron toda la información sobre los casos de uso extraídos de las entrevistas con el cliente y la contrastaron con los requisitos funcionales, con el objetivo de facilitar la especificación y elaboración de las fichas y diagramas en los siguientes sprints.


Para el segundo sprint, Tania sigue documentando todo respecto al informe scrum. Dividimos las tareas restantes de esta entrega (casos de uso) en dos mitades: especificación y esquematización. Unos 4 integrantes (Rubén, Lucas F., Lucas G., Julio) se encargan de revisar el documento en sucio elaborado en el anterior sprint (y de complementarlo con las secciones restantes) y pasarlo a un formato más detallado y formal para su correspondiente entrega. El resto del grupo (Tania, Fernando, Antonio y Alexandru) se han dividido los casos de uso en bloques funcionales (cobros, acceso, suscripciones, etc.) para que cada uno haga los diagramas de su correspondiente parte y después se junten para su entrega.

3. Sprints realizados


Sprint 1

Fecha de inicio	30/09/2026
Fecha de finalización	14/10/2026
Objetivo del Sprint	Identificar, analizar y documentar todos los requisitos posibles. Empezar a elaborar la especificación de algunos casos de uso.
Tareas planificadas	- Lectura de transcripciones y elaboración de documento inicial con los requisitos estudiados (todos los miembros). - Especificaciones más en profundidad de los requisitos y pasarlos al formato plantilla facilitado (4 miembros). - Primer contacto con los casos de uso, recopilando información inicial (3 miembros). - Documentar reuniones en informe (scrum master).
Tareas completadas	Todas las planificadas (en la primera semana se hizo el documento inicial de requisitos, el resto de tareas fueron asignadas para hacer en la segunda semana) salvo algunos puntos extra del documento de requisitos.
Reuniones realizadas	2 reuniones: 30/09 y 07/10
Problemas encontrados	- Dificultad a la hora de categorizar algunos requisitos. - Requisitos inicialmente ambiguos que daban lugar a confusiones o contradicciones. - Manejo del git para control de versiones.
Soluciones aplicadas	- Aclaración entre compañeros e intentar interpretarlos de la mejor manera posible ayudados de la teoría. - Revisión exhaustiva de las transcripciones para depurar lo máximo posible y apuntar aquellos requisitos aún confusos en el apartado de dudas. - El manejo del git sigue pendiente de especificar.

Estado del tablero en el Sprint Planning

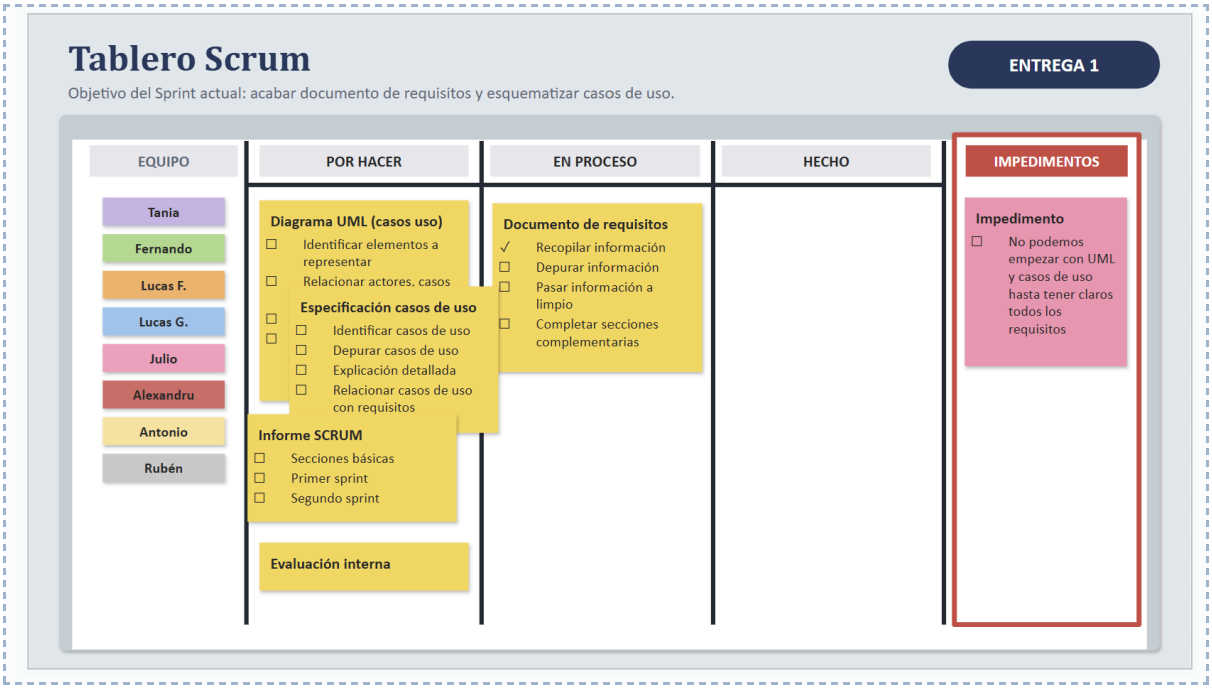


Estado del tablero en la Sprint Retrospective

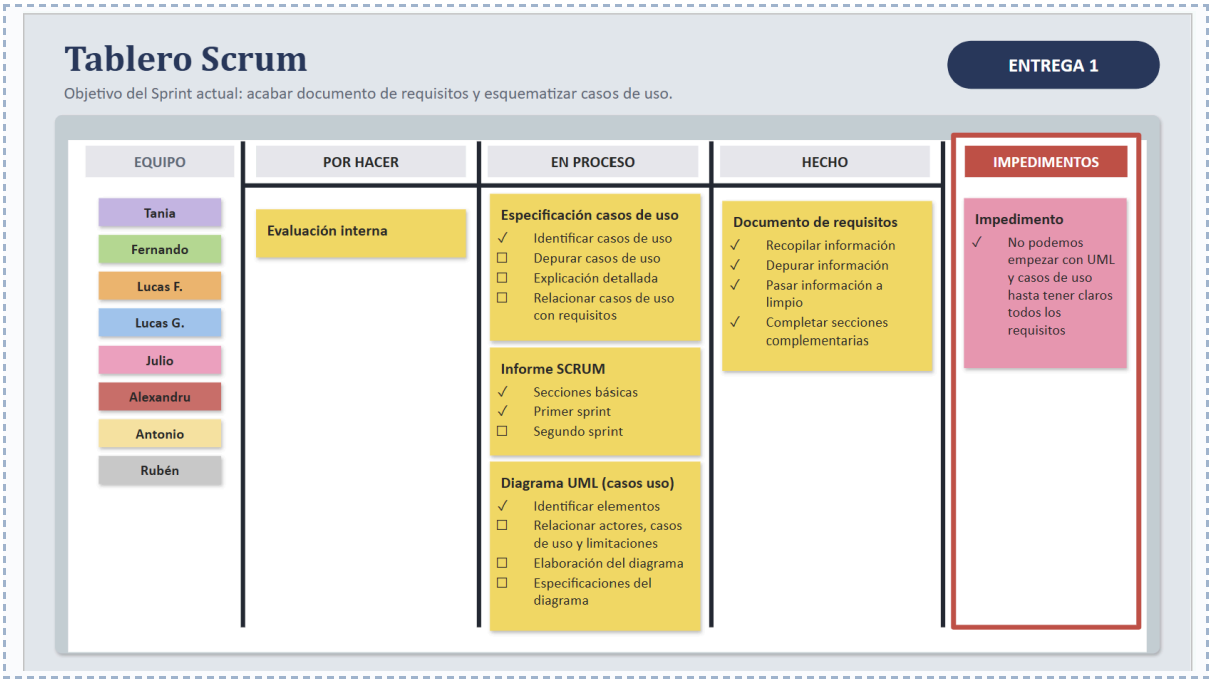


Sprint 2

Fecha de inicio	14/10/2026
Fecha de finalización	23/10/2026
Objetivo del Sprint	Escribir de forma más detallada la especificación de casos de uso. Elaborar los diagramas UML correspondientes.
Tareas planificadas	- Terminar las tareas atrasadas del anterior sprint. - Elaborar el documento de especificación de casos de uso con todos los puntos correspondientes. (4 miembros). - Crear diagrama UML de todos los casos de uso especificados (4 miembros). - Seguir documentando reuniones (scrum master).
Tareas completadas	Todas las planificadas, además de la elaboración de diapositivas explicativas para la sesión poster.
Reuniones realizadas	2 reuniones: 14/10 (virtual) y 21/10
Problemas encontrados	- Manejo útil del git. - Duda sobre algunos aspectos hablados por el cliente (superadministrador, darse de alta y de baja, confirmación al cliente, etc.) que incumben a los casos de uso.
Soluciones aplicadas	- Mantenemos control de versiones tanto en una carpeta drive compartida (con la que estamos más familiarizados) como en git para hacer commits y push/pull. - Dudas expuestas en la reunión y debatidas hasta llegar a un consenso entre los miembros del equipo sobre como solucionar cada ambigüedad.

Estado del tablero en el Sprint Planning

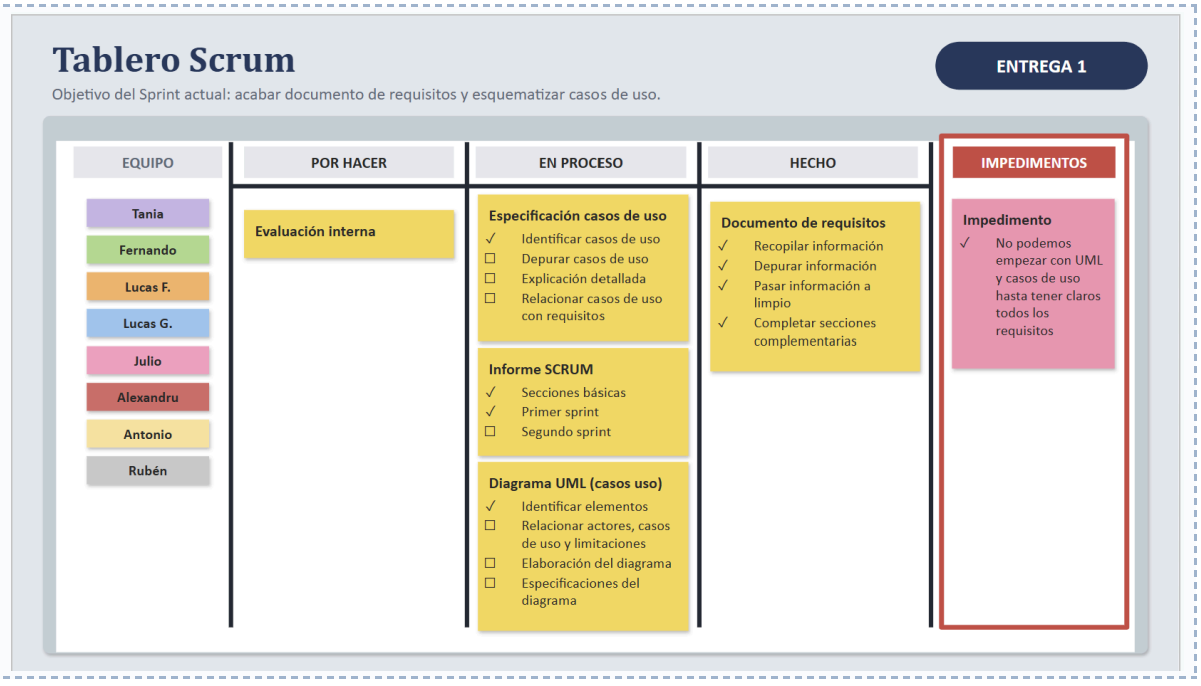

Estado del tablero en la Sprint Retrospective

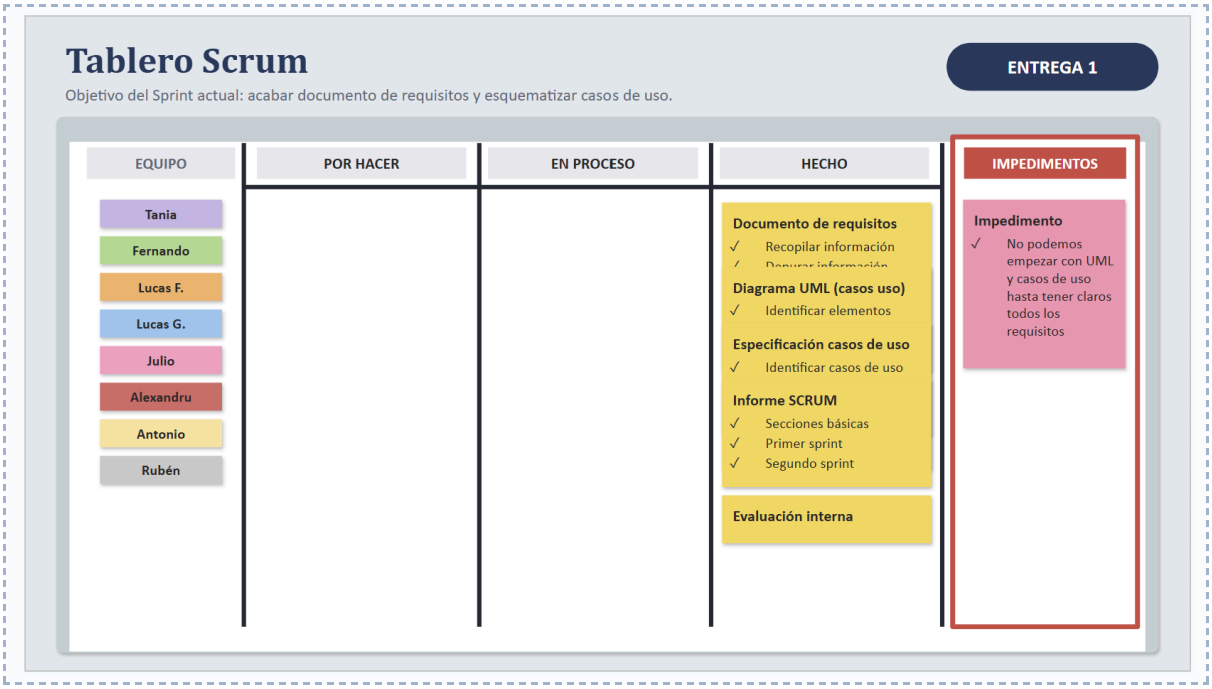

4. Problemas y riesgos

Todos los problemas encontrados se han ido especificando en las tablas de cada sprint, los problemas aún pendientes se intentarán solucionar lo antes posible en las siguientes entregas para no acarrear errores o complicaciones en implementaciones futuras.

5. Valoración final

Hemos conseguido completar todos los puntos necesarios de esta entrega (requisitos, diagrama UML y casos de uso), por lo cuál estamos satisfechos con el desempeño del grupo y como hemos ido trabajando progresivamente.

La división de tareas ha sido clara a un nivel general, pero a lo mejor deberíamos trabajar en el volumen de tarea individual que tiene cada integrante dentro de las divisiones. Básicamente dividir y especificar aún más dentro de las divisiones hasta llegar a una asignación individual en vez de una general de subgrupo. Esto se ha tenido en cuenta al hacer el tablero con las tareas.

Para los siguientes sprints seguiremos con este modelo de división de tareas semanal para ir trabajando de forma eficiente y no acumular una carga pesada de tareas para los últimos días.
